

## Projekt:

### „Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 2.“

Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci Operačného programu Životné prostredie a z vlastných zdrojov prijímateľa Oravskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Dolný Kubín.

## Polročná správa č. 12 za obdobie 06/2016 – 12/2016

### Základné údaje o projekte:

Prioritná os:

#### 1 - Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd

Operačný cieľ:

#### 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ.


Riadiaci orgán:

**Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky**

Prijímateľ pomoci:

**Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.**

Projekt nadväzuje na I. etapu projektu, ktorá bola ukončená 31. 08. 2009. Dňa 26. 08. 2010 bola podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok a dňa 14. 11. 2012 Európska komisia schválila veľký projekt odkanalizovania regiónu Oravy „Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 2.“ Ide o projekt financovaný z Operačného programu Životné prostredie (OPŽP) pod Ministerstvom životného prostredia. Realizáciou projektu bude na novú kanalizačnú sieť napojených **20 137 obyvateľov** zo 7 obcí **Vavrečka, Hruštín, Zákamenné, Novotý, Rabča, Oravská Polhora a Sihelné**. Odpadové vody od týchto producentov budú čistené na už vybudovanej ČOV Námestovo, ktorá bola vybudovaná v rámci prvej etapy projektu aj pre producentov etapy II. a ostatných obcí okresu Námestovo. V rámci projektu sa vybudovalo **126,1 km** gravitačnej kanalizácie, **11 ks** čerpacích staníc odpadových vôd a **8,9 km** výtlačného kanalizačného potrubia. Zrekonštruovali sa




existujúce čistiarne odpadových vôd v **Dolnom Kubíne** (23 000 EO) ktorá slúži pre čistenie odpadových vôd mesta Dolný Kubín a príslušných obcí a **ČOV v Nižnej n. Oravou** (26 000 EO) ktorá slúži pre čistenie odpadových vôd mesta Tvrdošín a Trstená a príslušných obcí.

### Základné fyzické indikátory po ukončení projektu:

- Dĺžka gravitačnej kanalizácie: **126 092,72 m**
- Dĺžka tlakovej kanalizácie: **8 924,07 m**
- Celková dĺžka kanalizácie: **135 016,79 m**
- Počet prípojok: **4782 ks**
- Počet kanalizačných šácht: **3390 ks**
- Dĺžka kanalizačných prípojok: **26 249,47 m**
- Počet čerpacích staníc (ČS): **11 ks**
- Predpokladaný počet napojených obyvateľov: **20 137 obyvateľov**
- ČOV Nižná n. Oravou (26 000 EO): **1 ks**
- ČOV Dolný Kubín (23 000 EO): **1 ks**

### Základné finančné údaje po ukončení projektu:

- Celkové výdavky: 42 035 478,41 €
- Celkové oprávnené výdavky: 36 711 969,76 €
- Príspevok NFP (EÚ + SR): 34 876 371,15 €
- Príspevok OVS, a.s.: 7 159 107,26 €



## Harmonogram projektu:

- Projekt nadväzuje na I. etapu projektu ktorý bol ukončený 31. 08. 2009,
- 26. 08. 2010 bola podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt etapy II.,
- 15. 05. 2012 bolo vo vestníku ÚVO zverejnené oznámenie na výber zhotoviteľa stavebných prác,
- 14. 11. 2012 Európska komisia schválila projekt,
- 28. 08. 2013 bol vydaný pokyn MŽP SR na podpis zmluvy na stavebné práce,
- Zmluva o dielo na stavebné práce bola uzavretá dňa 03. 09. 2013,
- Administratívny pokyn na začatie stavebných prác bol vydaný dňa 12. 09. 2013,
- Dňa 24. 09. 2011 je oficiálny termín začatia stavebných prác a služieb stavebného dozoru,
- Dňa 21. 12. 2015 bol vystavený Preberací protokol Sekcie č. 1 a č. 2.,
- Dielo bolo prebraté k 21. 12. 2015. Od tohto termínu plynula lehota na oznámenie vád v dĺžke 365 dní do 20. 12. 2016,
- 30. 06. 2016 bolo ukončenie realizácie aktivít projektu NFP,
- 20. 12. 2016 bol termín ukončenia 365 dňovej lehoty na oznámenie vád, z dôvodu pretrvávajúcich vád diela nedošlo k vydaniu protokolu o vyhotovení diela a lehota na oznámenie vád bola predĺžená do 30. 06. 2017,



## Skúšobná a trvalá prevádzka:

Skúšobná prevádzka stavby a trvalá prevádzka stavby (kolaudácia) bola povolená nasledovnými rozhodnutiami:

- Rozhodnutie OÚ ŽP Námestovo o povolení stavby do skúšobnej prevádzky č. OU-NO-OSZP-2016/012218 z 24. 10. 2016 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18. 11. 2016 (Aktivita I.),
- Rozhodnutie OÚ ŽP Námestovo o povolení stavby do skúšobnej prevádzky č. OU-NO-OSZP-2016/016129 z 24. 10. 2016 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18. 11. 2016 (Aktivita I., časť „Vavrečka“),
- Kolaudačné rozhodnutie OÚ ŽP Dolný Kubín č. OU-DK-OSZP-2016/006395/7SV z 13. 12. 2016 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15. 12. 2016 (Aktivita III., ČOV Dolný Kubín),
- Kolaudačné rozhodnutie OÚ ŽP Námestovo č. OU-NO-OSZP-2016/012219 z 13. 12. 2016 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19. 12. 2016 (Aktivita III., ČOV Dolný Kubín),
- Kolaudačné rozhodnutie OÚ ŽP Námestovo č. OU-NO-OSZP-2016/012220 z 15. 12. 2016 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20. 12. 2016 (Aktivita IV., ČOV Nižná),
- Rozhodnutie OÚ ŽP Námestovo o povolení stavby do skúšobnej prevádzky č. OU-NO-OSZP-2016/018481 z 19. 12. 2016 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20. 12. 2016 (Aktivita I., časť „Lokca, Breza, Krušetnica, Sihelné“),



## Súčasný stav projektu:

Dielo je uvedené do trvalej a skúšobnej prevádzky a v rámci lehoty na oznámenie vád prebieha identifikácia a odstraňovanie vád diela zhotoviteľom stavby.

## Stavebné práce:


Zhotoviteľ stavby predložil k ukončeniu lehoty na oznámenie vád, t.j. 12/2016 faktúry č. 01 až č. 23 v sume vykonaných prác k 30. 06. 2016 vo výške 40 103 437,41 €. Uvoľnené zádržné 10%, t.j. 3 161 200,21 € (zádržné z faktúr č. 1 až č. 20 bolo uvoľnené oproti bankovej záruke) v 12/2016. Lehota na oznámenie vád v termíne do 20. 12. 2016 bola rozhodnutím stavebného dozora predĺžená a nebol vydaný protokol o vyhotovení diela. V rámci lehoty na oznámenie vád prebieha identifikácia a odstraňovanie vád diela zhotoviteľom stavby.

### Kanalizácia:

K termínu 06/2016 boli dokončené všetky práce a pokračovali práce na odstraňovaní vád a nedorobkov v rámci lehoty na oznámenie vád. Preberací protokol na túto sekciu bol vystavený dňa 21. 12. 2015 a od tohto termínu plynie 365 dňová lehota na oznámenie vád do 20. 12. 2016. V rámci lehoty na oznámenie vád prebieha identifikácia a odstraňovanie vád diela zhotoviteľom stavby. K termínu 20. 12. 2016 nebol vydaný protokol o vyhotovení diela a bola predĺžená lehota na oznámenie vád. Stavba je uvedená do skúšobnej prevádzky nasledovnými rozhodnutiami. Rozhodnutie OÚ ŽP Námestovo o povolení stavby do skúšobnej prevádzky č. OU-NO-OSZP-2016/012218 z 24. 10. 2016 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18. 11. 2016 (Aktivita I.). Rozhodnutie OÚ ŽP Námestovo o povolení stavby do skúšobnej prevádzky č. OU-NO-OSZP-2016/016129 z 24. 10. 2016 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18. 11. 2016 (Aktivita I., časť „Vavrečka“). Rozhodnutie OÚ ŽP Námestovo o povolení stavby do skúšobnej prevádzky č. OU-NO-OSZP-2016/018481 z 19. 12. 2016 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20. 12. 2016 (Aktivita I., časť „Lokca, Breza, Krušetnica, Sihelné“). Aktivita je v skúšobnej prevádzke.

### ČOV Nižná n. O.:

K termínu 06/2016 prebiehali dokončovacie práce a práce na odstraňovaní vád a nedorobkov a terénne úpravy. ČOV pracovala v režime skúšobnej prevádzky. Dielo prebraté k 29. 05. 2015 a 05. 10. 2015. Rozhodnutie na skúšobnú prevádzku OU-NO-OSZP-2015/010668 z 12. 10. 2015, nadobudlo právoplatnosť dňa 26. 10. 2015. Predĺženie rozhodnutia na skúšobnú prevádzku OU-NO-OSZP-2016/002210 z 24. 02. 2016, nadobudlo právoplatnosť dňa 15. 03. 2016. Kolaudačné rozhodnutie

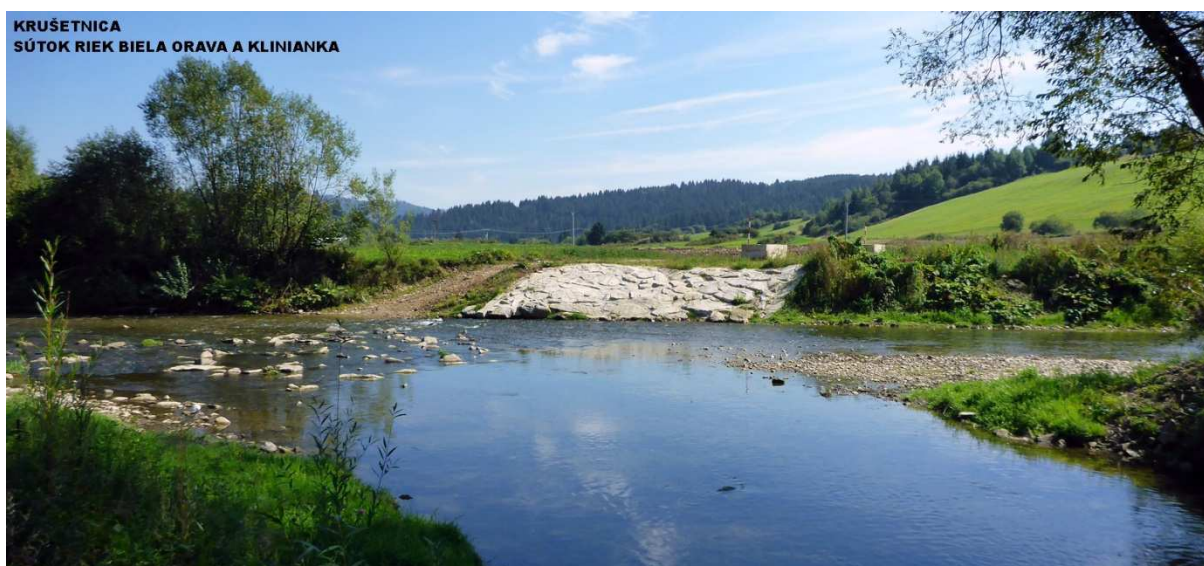

vydané OÚ ŽP Námestovo č. OU-NO-OSZP-2016/012220 z 15. 12. 2016 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20. 12. 2016. Na tejto aktivite skončila lehota na oznámenie vád v termíne do 04. 10. 2016 a plynie záručná doba. Aktivita je v trvalej prevádzke (skolaudovaná).

#### **ČOV Dolný Kubín:**

K termínu 06/2016 prebiehali dokončovacie práce a práce na odstraňovaní vád a nedorobkov a terénne úpravy. ČOV pracovala v režime skúšobnej prevádzky. Dielo prebraté k 26. 05. 2015 a 05. 10. 2015. Rozhodnutie na skúšobnú prevádzku OU-NO-OSZP-2015/010667 z 07. 10. 2015, nadobudlo právoplatnosť dňa 20. 10. 2015. Predĺženie rozhodnutia na skúšobnú prevádzku OU-NO-OSZP-2016/002212 z 24. 02. 2016, nadobudlo právoplatnosť dňa 15. 03. 2016. Kolaudačné rozhodnutie vydané OÚ ŽP Dolný Kubín č. OU-DK-OSZP-2016/006395/7SV z 13. 12. 2016 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15. 12. 2016 a kolaudačné rozhodnutie vydané OÚ ŽP Námestovo č. OU-NO-OSZP-2016/012219 z 13. 12. 2016 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19. 12. Na tejto aktivite skončila lehota na oznámenie vád v termíne do 04. 10. 2016 a plynie záručná doba. Aktivita je v trvalej prevádzke (skolaudovaná).

#### **Služby stavebného dozoru:**

Na stavbe pracovali stavební dozori v zložení vedúci stavebných dozorov (hlavný inžinier projektu), stavebný dozor pre kanalizáciu, stavebný dozor pre ČOV Dolný Kubín a stavebný dozor pre ČOV Nižná. Za sledované obdobie sa využívali aj služby špecialistov, 1x geodet stavby, 1x strojnotechnologický inžinier, technolog, elektrošpecialista a rozpočtár. Stavebný dozor predložil k sledovanému obdobiu faktúry č. 1 až č. 12 za obdobie do 07/2016 vo výške 1 844 400,0 €. Lehota na oznámenie vád v termíne do 20. 12. 2016 bola rozhodnutím stavebného dozora predĺžená, nebol vydaný protokol o vyhotovení diela. V rámci lehoty na oznámenie vád prebieha identifikácia a odstraňovanie vád diela zhotoviteľom stavby. Výkon služieb stavebného dozoru k 07/2016: 4063 osobodní.

#### **Propagácia a publicita projektu:**

K sledovanému obdobiu 06/2016 boli predložené faktúry č. 01. až 05. v celkovej výške spolu 21 861,- €. V termíne do 12/2016 pokračovali práce štandardným spôsobom. V mesiaci 12/2015 bola na všetkých obciach v súlade so zmluvou vykonaná informačná kampaň na projekte, kde boli všetci dotknutí občania zvolaní obecným rozhlasom a reklamnými plagátmi. Z kampane je vyhotovená foto a video dokumentácia. Súčasťou kampane bolo doručenie reklamných predmetov, kalendárikov a informačných brožúr do každej domácnosti, celkom 5545 domácností. Boli vykonané všetky práce na zverejnení v tlačových, televíznych a rozhlasových masmédiách a na internetových portáloch. Na stránke [www.ovs.sk](http://www.ovs.sk) boli zverejnené štvrťročné správy. Taktiež boli dodané reklamné a propagačné materiály. Na stavbe sú osadené pamätné tabule, základný kameň a informačné billboardy. Dňa 29. 04. 2014 sa uskutočnilo slávnostné zahájenie stavby a dňa 26. 10. 2016 sa uskutočnilo slávnostné ukončenie stavby.

